Compte rendu · recette fonctionnelle · session 1 (19-20 novembre 2026)

Nov 23, 2026 · @Arnaud



Recette fonctionnelle des nouvelles régies de diffusion des chaînes d'outre-mer (MBT, Workflows, Cerebrum) · bascule On Air prévue le 26 janvier 2027.

Pour la direction technique de la DOPOM, les chefs de projet et les ingénieurs

De Arnaud Allovon, superviseur

Situation au 23 novembre 2026.

1. Synthèse pour la direction

La session 1 a testé 112 scénarios sur 555 (20,2 %) avec 59,8 % de réussite. Au rythme constaté, l'avancement atteindrait environ 60,5 % à la bascule prévue le 26 janvier. A noter, au fil de le la recette fonctionnelle et de leurs compréhension du système, les testeurs vont ajouter des scénarios.

1. **Une première couverture de 20,2 %.** 112 scénarios testés (67 réussis, 45 en échec dont 36 partiels), 29 bloqués, 414 à tester. Au soir du 20 novembre, l'avancement était de 23,8 % (112 sur 470) ; les 85 scénarios du **Chef de chaîne 2** ajoutés ensuite le ramènent à 20,2 %.
2. **Des premiers résultats encourageants, mais localisés.** TerraLAN au **Cecom**, Phoenix Editor au **Chef de chaîne 1** (14 réussis sur 15) et les tests en **Régie de diffusion 1** donnent de bons résultats. Les **Régies de diffusion 2 et 3** et le **Chef de chaîne 2** ne sont presque pas testés : ces résultats ne se généralisent pas encore.
3. **38 anomalies signalées, 37 à suivre, toutes encore « ouvertes ».** Par lieu : **Cecom** : 13, **Régie de diffusion 1** : 11, **Régie de diffusion 3** : 7, **Chef de chaîne 1** : 4 (et 1 clôturée). Les 5 critiques sont au **Cecom** ; 7 blocages d'installation empêchent 29 scénarios (16 faute des liaisons Globecast).
4. **Des conditions de recette à améliorer impérativement.** Le premier jour, les lieux de recette étaient occupés par d'autres activités. La recette des superviseurs n'est pas possible pour l'instant.

5. **Une trajectoire insuffisante.** 56 scénarios testés par jour mènent à 60,5 %. Pour atteindre 90 %, il faut 388 scénarios de plus en 4 jours, soit 97 par jour (+73 %), en plus des 74 retests attendus.

Conclusion et décisions attendues

La recette est engagée, malheureusement le nombre de tests effectués par jour n'est pas assez important pour arriver à une recette fonctionnelle complète.

- **Réserver les régies** pendant les deux jours de chaque session (26-27 novembre, 3-4 décembre).
- **Mettre à disposition trois personnes** de l'équipe Broadteam en renfort.
- **Prioriser les anomalies critiques** et les installations manquantes (liaisons Globecast, profils Cerebrum).
- **Définir les conditions de démarrage** de la recette des superviseurs.

2. Conditions de la session et demandes

Le premier jour, les lieux de recette étaient occupés par d'autres activités : c'est le premier frein à lever.

Constats du superviseur recetteur, présent pendant les deux jours

- Le **Training Lab** occupait la **Régie de diffusion 2** : 3 scénarios ont pu être testés sur 98.
- Une **formation « supply chain »** avait lieu dans le bureau des superviseurs.
- Les **ingénieurs** travaillaient au **Cecom**.
- La **recette fonctionnelle des superviseurs est impossible** pour l'instant : formation insuffisante, trop peu de procédures, outils non configurés, périmètres non définis.

Ce que nous demandons

1. **Des régies libres pendant les deux jours de chaque session** : les 26 et 27 novembre, puis les 3 et 4 décembre, sans Training Lab, formation ni intervention technique dans les lieux à tester.
2. **Trois personnes de l'équipe Broadteam en renfort** pendant ces sessions, pour passer de 56 à environ 97 scénarios testés par jour.
3. **Un plan pour la recette des superviseurs à faire** : formation, procédures, configuration des outils et périmètres définis. Sans cela, elle ne peut pas commencer.

3. Où en est la recette

À la fin de la session, 112 scénarios sur 555 étaient testés. À ce rythme, la recette fonctionnelle finirait vers 336 (60,5 %), loin des 500 qu'il faut pour atteindre 90 %.

Indicateur	Nombre	Part
Scénarios testés	**112**	20,2 % des 555 scénarios
dont réussis	67	59,8 % des testés
dont en échec	45, dont 36 partiels	40,2 % des testés
Bloqués	**29**	5,2 % des scénarios
À tester	**414**	74,6 % des scénarios
Anomalies à suivre	**37**	5 critiques, 25 majeures, 7 mineures
Retests attendus	**74**	45 en échec et 29 bloqués

Au rythme de la session 1, environ 60 % à la bascule ; 90 % demanderait 97 scénarios par jour

Scénarios testés cumulés, par jour de recette fonctionnelle (périmètre : 555 scénarios)

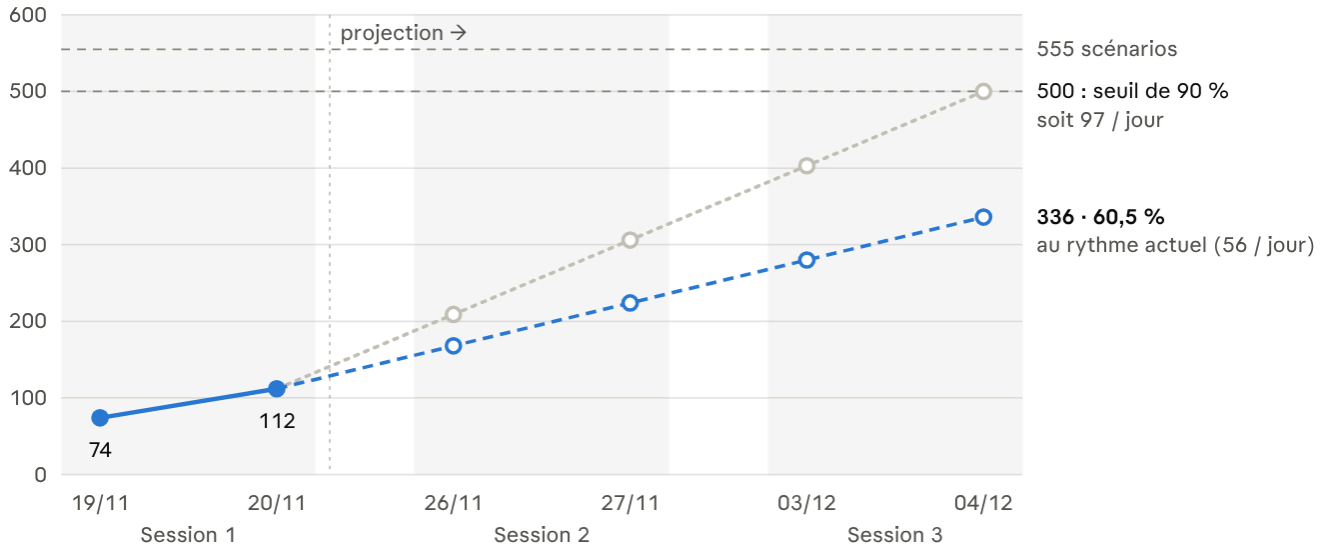

Outil « Recette & Tests » · export du 22/11/2026 · projection de l'outil et rythme nécessaire pour 90 %

Aucune session fonctionnelle n'est prévue après le 4 décembre.

4. Résultats par lieu

Trois lieux ont été réellement testés : le **Cecom**, la **Régie de diffusion 1** et le **Chef de chaîne 1**, qui totalisent 97 des 112 scénarios testés.

Le Cecom est le plus avancé, mais 19 de ses scénarios sont bloqués

État des scénarios par lieu, en part du nombre de scénarios du lieu · à droite : avancement (testés ÷ scénarios)

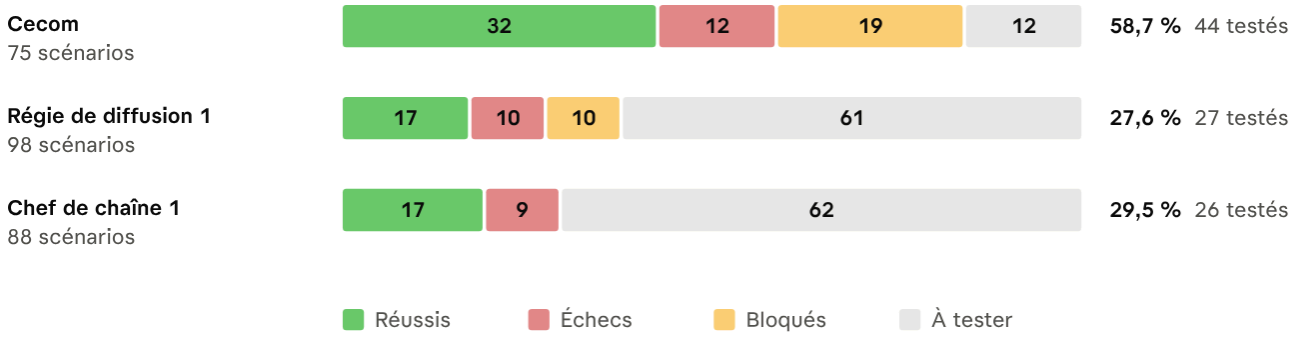

Outil « Recette & Tests » · export du 22/11/2026 · échecs = échecs et partiels

Dans les autres lieux, le nombre de tests est anecdotique : **Régie de diffusion 2** (3 sur 98, régie occupée par le Training Lab), **Régie de diffusion 3** (7 sur 102), **Superviseur** (1 sur 5), **Chef de chaîne 2** (aucun, scénarios ajoutés après la session) et 4 scénarios saisis sans numéro de régie. Aucun scénario de la sous-catégorie Diffusion n'a été testé dans les **Régies 2 et 3**.

Cecom

- **44 scénarios testés sur 75** (58,7 %), 72,7 % de réussite, 19 bloqués.
- **Fonctionne** : commutations TerraLAN vers les destinations du Cecom (SC221 à SC227), échanges TerraLAN ↔ TerraDIFF (SC229 à SC233), outils de contrôle et alarming des remontées (SC242 à SC244, SC269 à SC271).
- **Bloqué** : 14 scénarios sur 20 des remontées TV des stations, faute des liaisons Globecast (AN-237-01).
- **À traiter** : les 5 anomalies critiques de la session sont ici (Globecast, mosaïque radio en voie A, UDC, dalle centrale, encodeur HELO AJA) ; mosaïques, 3 partiels sur 4.

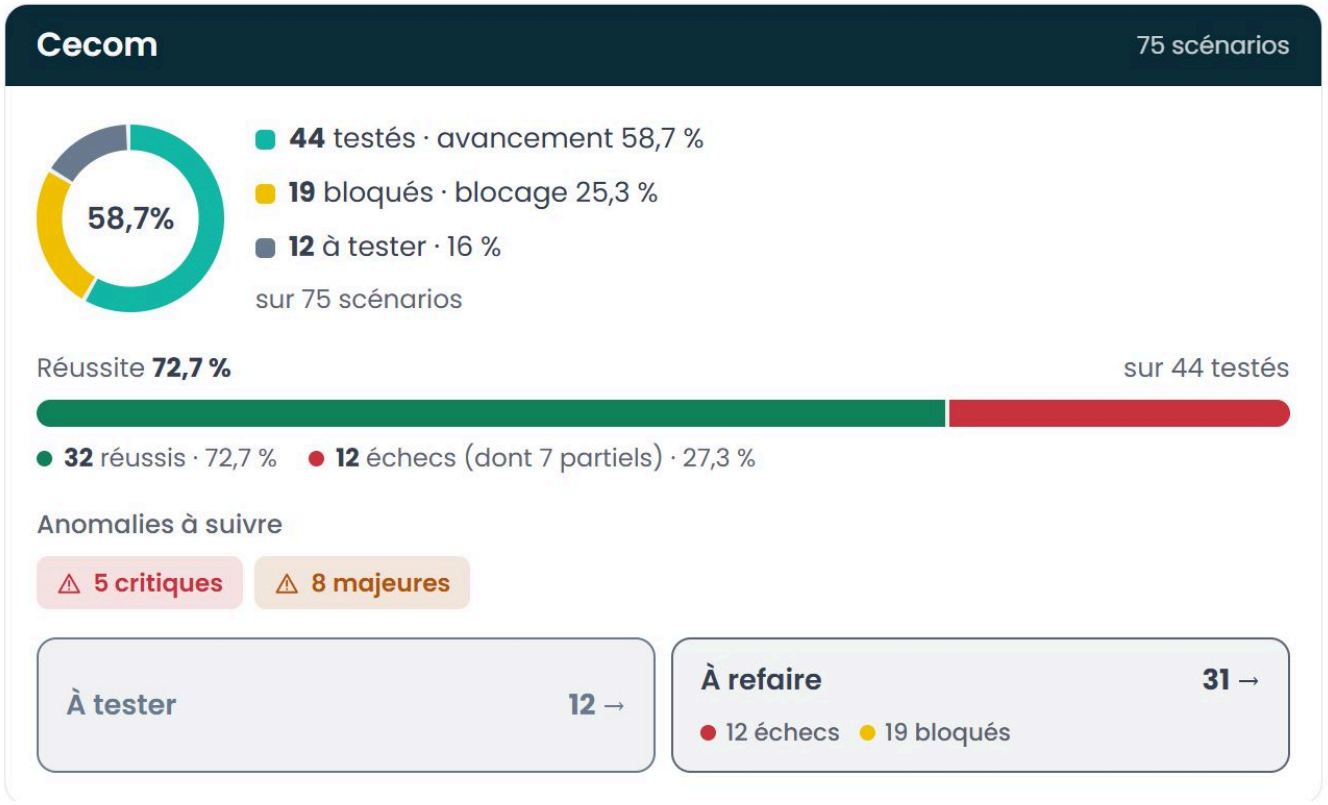

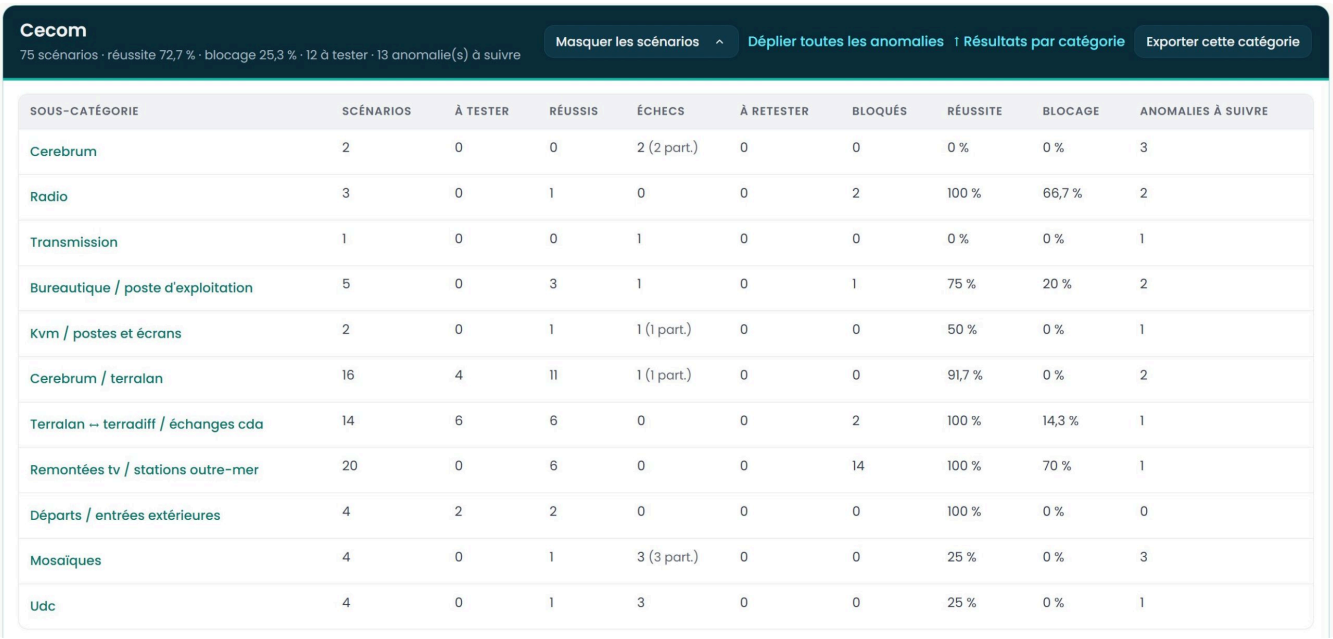

Cecom

75 scénarios · réussite 72,7 % · blocage 25,3 % · 12 à tester · 13 anomalie(s) à suivre

Masquer les scénarios | Déplier toutes les anomalies | ↕ Résultats par catégorie | Exporter cette catégorie

SOUS-CATÉGORIE	SCÉNARIOS	À TESTER	RÉUSSIS	ÉCHECS	À RETESTER	BLOQUÉS	RÉUSSITE	BLOCAGE	ANOMALIES À SUIVRE
Cerebrum	2	0	0	2 (2 part.)	0	0	0 %	0 %	3
Radio	3	0	1	0	0	2	100 %	66,7 %	2
Transmission	1	0	0	1	0	0	0 %	0 %	1
Bureautique / poste d'exploitation	5	0	3	1	0	1	75 %	20 %	2
Kvm / postes et écrans	2	0	1	1 (1 part.)	0	0	50 %	0 %	1
Cerebrum / terralan	16	4	11	1 (1 part.)	0	0	91,7 %	0 %	2
Terralan ↔ terradiff / échanges cda	14	6	6	0	0	2	100 %	14,3 %	1
Remontées tv / stations outre-mer	20	0	6	0	0	14	100 %	70 %	1
Départs / entrées extérieures	4	2	2	0	0	0	100 %	0 %	0
Mosaïques	4	0	1	3 (3 part.)	0	0	25 %	0 %	3
Udc	4	0	1	3	0	0	25 %	0 %	1

Régie de diffusion 1

- **27 scénarios testés sur 98** (27,6 %), 63 % de réussite, 10 bloqués.
- **Fonctionne** : MBT: avec change over et tally (SC308), CUE puis PLAY des playlists (SC312), édition dans une playlist (SC313, SC315, SC316), EVS manuel (SC319) ; verrouillage des mélangeurs (SC290, SC291, SC294, SC295) ; monitoring 3 à 5 départs (SC301 à SC303).

- **Ne fonctionne pas** : Cerebrum, 9 échecs et 10 bloqués. Profils DIFF 2-3 et DIFF 3-3 absents (AN-281-01), mélangeurs (AN-284-01, AN-288-01, AN-289-01, AN-297-01), preview Spectrum X (AN-299-01), lay-out LIBRE non mémorisé (AN-359-01) ; copie entre playlists (AN-314-01).
- **Reste** : 54 scénarios Diffusion sur 61 à tester.

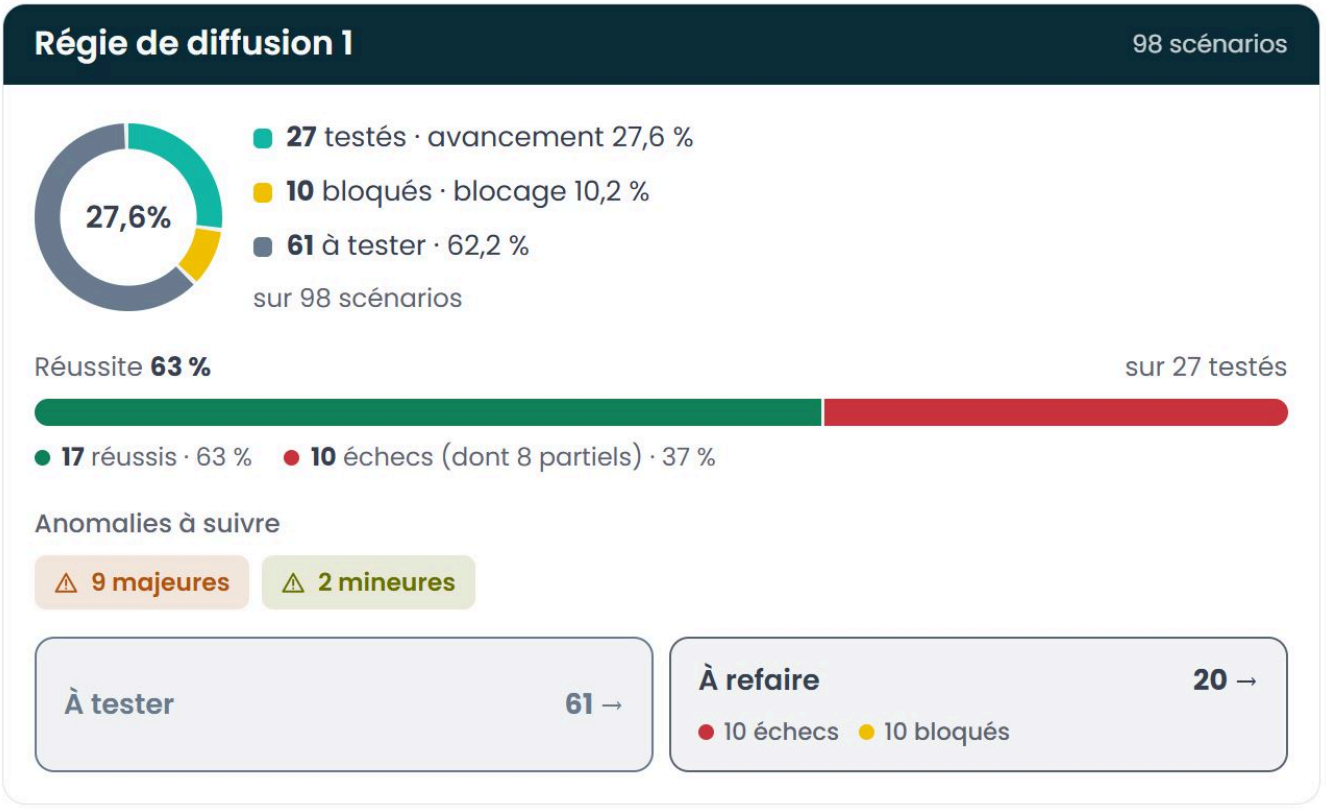

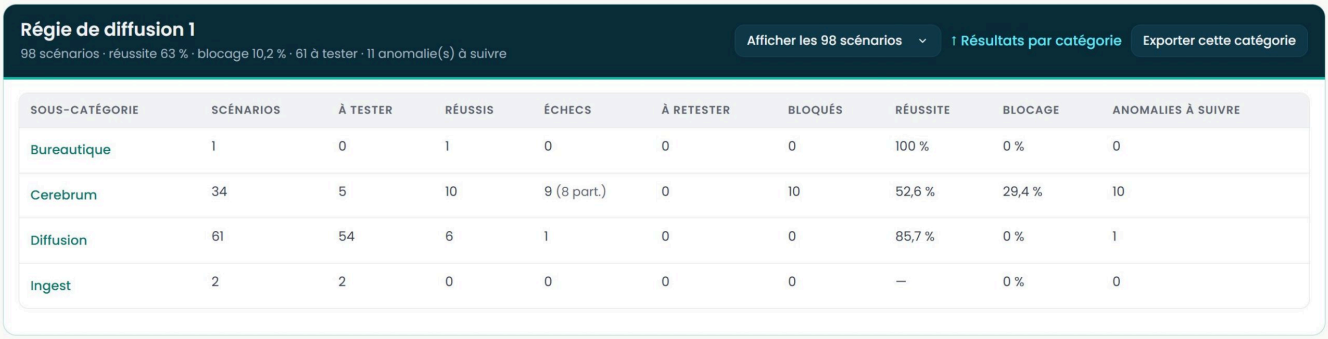

SOUS-CATÉGORIE	SCÉNARIOS	À TESTER	RÉUSSIS	ÉCHECS	À RETESTER	BLOQUÉS	RÉUSSITE	BLOCAGE	ANOMALIES À SUIVRE
Bureautique	1	0	1	0	0	0	100 %	0 %	0
Cerebrum	34	5	10	9 (8 part.)	0	10	52,6 %	29,4 %	10
Diffusion	61	54	6	1	0	0	85,7 %	0 %	1
Ingest	2	2	0	0	0	0	—	0 %	0

Chef de chaîne 1

- **26 scénarios testés sur 88** (29,5 %), 65,4 % de réussite, aucun bloqué.
- **Fonctionne** : Phoenix Editor, 14 réussis sur 15 (ouverture, mise à jour et modification des conducteurs, insertion d'événements) ; pas de doublons à l'export (SC565, SC567).
- **Ne fonctionne pas** : Sherlock, 8 partiels sur 11, tous sur l'export des conducteurs vers MBT. Durée des boucles non reportée (AN-126-01, AN-127-01), directs sans ID media (AN-152-01).

- **Retest** : SC579 réussi, AN-579-01 clôturée.

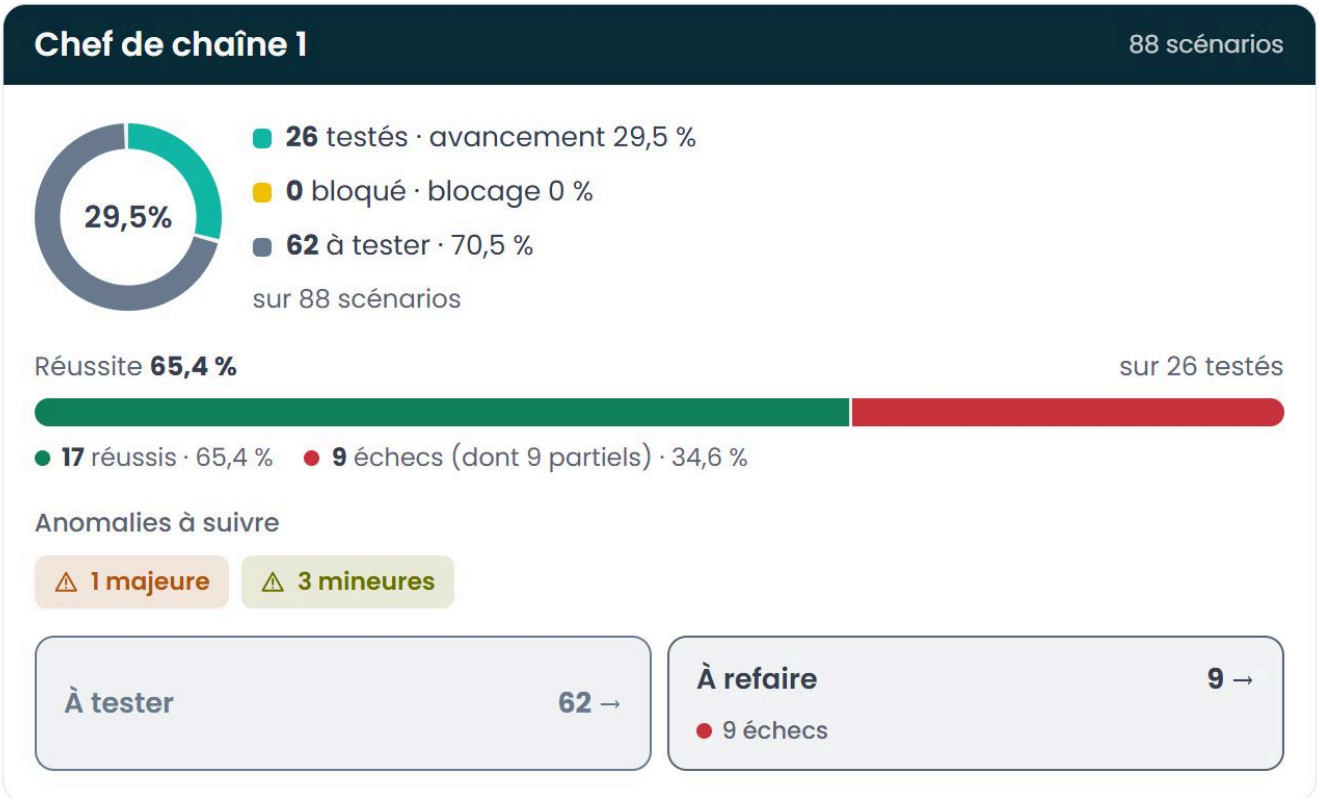



SOUS-CATÉGORIE	SCÉNARIOS	À TESTER	RÉUSSIS	ÉCHECS	À RETESTER	BLOQUÉS	RÉUSSITE	BLOCAGE	ANOMALIES À SUIVRE
Sherlock	37	26	3	8 (8 part.)	0	0	27,3 %	0 %	3
Phoenix editor	49	34	14	1 (1 part.)	0	0	93,3 %	0 %	1
Phoenix monitor	1	1	0	0	0	0	—	0 %	0
Mbt	1	1	0	0	0	0	—	0 %	0

5. Anomalies prioritaires et sujets de fond

Les 37 anomalies à suivre se ramènent à 8 sujets de fond : chercher la cause commune vaut mieux que corriger scénario par scénario.

Les 5 anomalies critiques

Anomalie	Constat	Situation
AN-237-01	Liaisons Globecast indisponibles, sources des stations absentes	Blocage d'installation ; 17 scénarios liés, dont 16 bloqués
AN-573-01	Pas de mosaïque radio en voie A au Cecom (SC573)	Blocage d'installation

Anomalie	Constat	Situation
AN-584-01	Mapping audio impossible sur les UDC (SC584 à SC587)	Résolue sur SC584 au retest ; SC585 à SC587 toujours en échec
AN-589-01	Dalle centrale du Cecom prise en permanence par le Prismon (SC589)	Partiel ; comportement exact et criticité à confirmer
AN-594-01	Impossible d'affecter une source vers l'encodeur HELO AJA (SC594)	Échec ; câblage direct signalé

Pour ces cinq anomalies, le responsable et l'action corrective ne sont pas encore renseignés. Leur gravité « critique » ne veut pas dire qu'elles bloquent toutes la bascule : leur effet sur l'exploitation reste à évaluer.

Les sujets de fond

Sujet	Anomalies	Ce qu'on observe
Profils Cerebrum	AN-281-01, AN-030-01, AN-284-02	Profils DIFF 2-3 et DIFF 3-3 absents (12 scénarios, 7 bloqués) ; profils DIF SEC à créer et harmoniser
Mélangeurs	AN-284-01, AN-288-01, AN-289-01, AN-297-01, AN-296-01	Chaîne SPARE sans boucle ni bypass, touches MAIN non attribuées, page SHIFT inopérante (ANT GUY, DOM SPM), EVS OKOO introuvables sur le keyer 7 (6 scénarios, 3 régies)
Écoute Wohler	AN-214-01, AN-279-01, AN-470-01, AN-568-01, AN-569-01	LOOP PLAY sans son ou son d'un autre poste, dans 4 lieux
Monitoring et mosaïques	AN-589-01, AN-573-01, AN-060-01, AN-299-01, AN-359-01, AN-566-01, AN-574-01, AN-588-01, AN-590-01, AN-592-01	UMD « Undefined », lay-outs non harmonisés ou non mémorisés, preview Spectrum X, mosaïques du Cecom inadaptées
Playlists MBT	AN-068-01, AN-314-01, AN-575-01	Copie entre playlists impossible (« DEV non prévu ») ; preview refusé depuis Phoenix Monitor (erreur 100107)

Sujet	Anomalies	Ce qu'on observe
Conducteurs Sherlock → MBT	AN-126-01, AN-127-01, AN-152-01, AN-158-01	Durée des boucles fichier non reportée (le direct suivant est décalé), directs sans ID media non exportés, pas d'avertissement de mise à jour
Liaisons et équipements	AN-237-01, AN-584-01, AN-594-01, AN-571-01	Globecast absent, UDC 2 à 4, streamer non câblé, pas de contrôle d'une source radio sans la commuter
Accès et comptes	AN-217-01, AN-219-01, AN-591-01	Rainbow non activé au Cecom, outil de compte rendu de vacation absent, login « regie3 » absent du Video Manager

Doublons probables, à analyser ensemble avant toute fusion

- **AN-126-01** et **AN-127-01** : même description (durée des boucles fichier).
- **AN-068-01** et **AN-314-01** : copie entre playlists, signalée dans deux catégories.
- **AN-214-01** et **AN-279-01**, **AN-470-01**, **AN-568-01**, **AN-569-01** : AN-214-01 décrit déjà les quatre autres postes.

6. Blocages d'installation

7 anomalies de nature « Blocage » empêchent 29 scénarios. Ce ne sont pas des échecs des systèmes testés, mais leur résolution est un préalable à la reprise de ces tests.

Anomalie	Gravité	Lieu	Ce qui manque	Scénarios bloqués
AN-237-01	Critique	Cecom	Liaisons Globecast	16
AN-281-01	Majeure	Régie de diffusion 1	Profils Cerebrum DIFF 2-3 et DIFF 3-3	7
AN-288-01	Mineure	Régie de diffusion 1	Touches des mélangeurs MAIN non attribuées	2
AN-219-01	Majeure	Cecom	Outil de compte rendu de vacation	1

Anomalie	Gravité	Lieu	Ce qui manque	Scénarios bloqués
AN-296-01	Majeure	Régie de diffusion 1	UDC inopérant, sources audio de test absentes	1
AN-571-01	Majeure	Cecom	Contrôle d'une source radio sans la commuter	1
AN-573-01	Critique	Cecom	Mosaïque radio en voie A	1
Total				**29**

7. Prochaines étapes

La priorité va à la préparation des installations, aux anomalies critiques et à l'organisation de la session 2 (26-27 novembre).

Direction technique DOPOM et chefs de projet

1. Garantir les régies libres pendant les deux journées complètes des sessions du 26-27 novembre et du 3-4 décembre.
2. Valider le renfort de trois personnes de l'équipe Broadteam.
3. Faire prioriser les prérequis techniques : liaisons Globecast, profils Cerebrum, équipements et interfaces manquants.
4. Réexaminer l'objectif et le calendrier : les quatre journées restantes suffisent-elles, ou faut-il des créneaux pour la recette fonctionnelle en plus, avant la bascule ?

Ingénieurs (recette technique du 23 au 25 novembre)

1. Lever d'abord les blocages AN-237-01 (Globecast, 16 scénarios), AN-281-01 (profils Cerebrum, 7) et AN-573-01 (mosaïque radio).
2. Traiter les anomalies critiques : UDC, mosaïques du Cecom, encodeur HELO AJA.
3. Harmoniser les configurations : profils Cerebrum, mélangeurs, lay-outs Phoenix Monitor, comptes d'accès.
4. Chercher les causes communes : écoutes Wohler, durée des boucles, copie entre playlists.
5. Renseigner, dans le classeur des ingénieurs, un responsable, une action corrective et un statut pour chaque anomalie.

Superviseurs et responsables de l'exploitation

1. Définir le périmètre fonctionnel de la supervision et les responsabilités associées.
2. Compléter les procédures et identifier les outils ou configurations manquants.
3. Prévoir les formations, puis une première recette des superviseurs une fois ces prérequis réunis.

8. Questions à traiter

Ce bilan ne repose que sur deux journées de saisie, mais il montre que nous devons mieux nous organiser si l'on veut atteindre notre objectif de recette fonctionnelle

Questions

- **Organisation** : les régies seront-elles réellement libres les 26 et 27 novembre ? Les trois personnes de Broadteam pourront-elles être présentes ? Des créneaux fonctionnels en plus sont-ils possibles ?
- **Installations** : quelles dates pour les liaisons Globecast et les profils Cerebrum manquants ? Les sources audio de test seront-elles là ? Qui confirme que les installations sont prêtes avant l'arrivée des testeurs ?
- **Anomalies** : les défauts d'écoute Wohler ont-ils une cause commune ? La copie entre playlists est-elle prévue dans le fonctionnement cible ? Pour AN-589-01, quel comportement du Prismon justifie la criticité ? Pour AN-594-01, câblage à faire ou défaut de commande ? Quels critères pour considérer les critiques comme traitées avant la diffusion à blanc ?
- **Supervision** : quel périmètre tester, et à quelle date formations, procédures et outils seront-ils prêts ?

Annexe A · Les 37 anomalies à suivre

Triées de Critique à Mineure, blocages d'abord. Le lieu est celui du scénario où l'anomalie a été signalée en premier ; les textes sont ceux des testeurs.

N°	Gravité	Nature	Lieu › sous-catégorie	Scénarios	Problème (texte du testeur)
AN-237-01	Critique	Blocage	Cecom › Remontées tv / stations outre-mer	SC237 + 16 autres	Liaisons Globecast non disponibles. Sources vides
AN-573-01	Critique	Blocage	Cecom › Radio	SC573	Il n'y a pas de mosaïque radio en voie A
AN-584-01	Critique	Défaut	Cecom › Udc	SC584, SC585, SC586, SC587	il est impossible de faire le mapping audio sur l'UDC

N°	Gravité	Nature	Lieu › sous-catégorie	Scénarios	Problème (texte du testeur)
AN-589-01	Critique	Défaut	Cecom › Mosaïques	SC589	Impossible d'apprécier ce qu'il y a en dalle centrale au CECOM. Le Prismon prend la main en permanence
AN-594-01	Critique	Défaut	Cecom › Transmission	SC594	Impossible d'affecter une source vers le streamer.
AN-219-01	Majeure	Blocage	Cecom › Bureautique / poste d'exploitation	SC219	Outil de compte rendu de vacation non disponible
AN-281-01	Majeure	Blocage	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC281 + 11 autres	Il manque les profils Cerebrum DIFF 2-3 et DIFF 3-3.
AN-296-01	Majeure	Blocage	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC296	UDC inopérant
AN-571-01	Majeure	Blocage	Cecom › Radio	SC571	Impossible de contrôler une source radio sans avoir à la commuter dans un départ radio. Fugitif impossible
AN-030-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion (sans n°) › Cerebrum	SC030	Il manque le profil DIF2-3 donc pas testé.
AN-060-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion (sans n°) › Diffusion	SC060	Les lay-outs Phoenix Monitor ne sont pas harmonisés sur toutes les VM comme prévu.
AN-068-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion (sans n°) › Diffusion	SC068	On ne peut pas copier un élément sur une playlist et le coller sur une autre playlist.
AN-152-01	Majeure	Défaut	Chef de chaîne 1 › Sherlock	SC152, SC153	Les programmes en direct n'ont pas d'ID media et ne sont pas exportés
AN-214-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion (sans n°) › Cerebrum	SC214	DIFF 1-2 : LOOP PLAY A et B sans son. CECOM 1 : LOOP PLAY A et B sans son. DIFF 3-2 & CECOM 2 : Si on commute sur un on pique le son de l'autre mais peut-être un 3è poste dans la boucle. SUP : LOOP PLAY B sans son. Les autres postes fonctionnent.
AN-217-01	Majeure	Défaut	Cecom › Bureautique / poste d'exploitation	SC217	Impossible d'accéder à l'application métier Rainbow
AN-279-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC279	LOOP PLAY A et B sans son.

N°	Gravité	Nature	Lieu › sous-catégorie	Scénarios	Problème (texte du testeur)
AN-284-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC284, SC286, SC287	Boucle et Bypass de la chaîne SPARE ne fonctionnent pas
AN-284-02	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC284	Profils DIF SEC à travailler (créer 3 profils DIF SEC 1, 2 et 3, mettre les bons mélangeurs et les harmoniser)
AN-289-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC289, SC293	La page config mélangeur SHIFT ne fonctionne pas sur ANT GUY (A et B) et DOM SPM.
AN-299-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC299, SC300	La source preview dans le Spectrom X ne commute pas .
AN-314-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Diffusion	SC314	DEV non prévu
AN-359-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC359	la configuration du lay-out n'est pas mémorisée
AN-470-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 3 › Cerebrum	SC470, SC568	DIFF 3-2 & CECOM 2 : Si on commute sur un on pique le son de l'autre, mais peut-être un 3è poste dans la boucle.
AN-566-01	Majeure	Défaut	Cecom › Kvm / postes et écrans	SC228, SC566, SC570	En mosaïque une commutation audio-video se fait mais l'information UMD n'accroche pas et reste en "Undifined"
AN-568-01	Majeure	Défaut	Cecom › Cerebrum	SC568	CECOM 1 : LOOP PLAY A et B sans son.
AN-569-01	Majeure	Défaut	Superviseur › Cerebrum	SC569	SUP : LOOP PLAY B sans son. Les autres postes fonctionnent.
AN-574-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 3 › Contributions	SC574	Impossible de lire proprement les informations affichées sur le carton intercalaire habillage contributions. Alarming visuel gène la lisibilité

N°	Gravité	Nature	Lieu › sous-catégorie	Scénarios	Problème (texte du testeur)
AN-575-01	Majeure	Défaut	Régie de diffusion 3 › Contributions	SC575	Depuis Phoenix Monitor, J'ai une erreur "Commande Cue refusée Erreur non définie 100107". Il est impossible de charger puis de démarrer la lecture d'un Preview
AN-588-01	Majeure	Défaut	Cecom › Mosaïques	SC588	Layout monitoring mosaïque non adapté à la fonction cible
AN-590-01	Majeure	Défaut	Cecom › Mosaïques	SC590	Le layout mosaïque n'est pas bien représenté dans la section monitoring du Cerebrum
AN-288-01	Mineure	Blocage	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC288, SC292	Toutes les touches des mélangeurs MAIN ne sont pas attribuées
AN-126-01	Mineure	Défaut	Chef de chaîne 1 › Sherlock	SC125, SC126, SC129	La durée des boucles fichier n'est pas reportée. La durée totale s'affiche et le direct qui suit est décalé.
AN-127-01	Mineure	Défaut	Chef de chaîne 1 › Sherlock	SC127, SC128, SC134	La durée des boucles fichier n'est pas reportée. La durée totale s'affiche et le direct qui suit est décalé.
AN-158-01	Mineure	Défaut	Chef de chaîne 1 › Phoenix editor	SC158	Lorsque le conducteur est ouvert dans l'Editor nous devrions recevoir un pop-up disant qu'il a été mis à jour qui n'arrive pas. A tester à nouveau
AN-297-01	Mineure	Défaut	Régie de diffusion 1 › Cerebrum	SC297 + 5 autres	Pour Keyer 7 : Impossible de sélectionner les EVS : OKOO AM et OKOO PM
AN-591-01	Mineure	Défaut	Régie de diffusion 3 › Ingest	SC591	Impossible d'accéder au Video Manager avec le login "regie3"
AN-592-01	Mineure	Défaut	Régie de diffusion 3 › Contributions	SC592	Le canal contrib PACIND est mal représenté en mosaïque diff 3 départs. Il manque la vignette A en Disconnect.

Annexe B · Vue d'ensemble dans l'outil, sources et méthode

Captures de l'outil « Recette & Tests » au 22 novembre 2026 : vue « Toute la recette », puis « Évolution jusqu'à la bascule ».



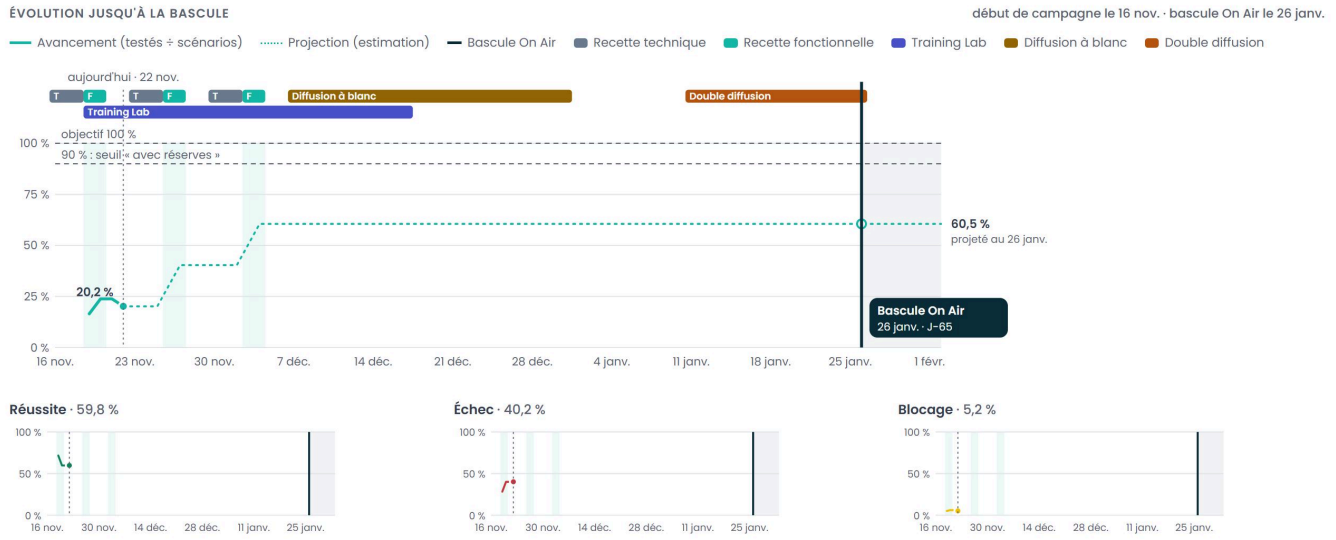

Sources et méthode

- **Tous les chiffres de ce compte rendu sont issus de l'outil « Recette & Tests »**
- Statut d'un scénario = résultat de sa dernière saisie. Partiel = compté comme un échec. Bloqué = test impossible, cause rattachée à une anomalie de nature « Blocage ».
- Avancement = scénarios testés ÷ scénarios ; réussite = réussis ÷ testés. Atteindre 90 % d'avancement ne signifie pas 90 % de réussite.
- L'outil compte 121 « tests effectués » : les 150 saisies, moins les 29 saisies « Bloqué ». Il ne faut pas les confondre avec les 112 scénarios testés.
- La projection est celle de l'outil : moyenne des jours de recette fonctionnelle, appliquée aux 4 jours restants. C'est une estimation.
- Rythme nécessaire pour 90 % : 500 scénarios (90 % de 555) moins les 112 déjà testés, sur 4 jours, soit 97 par jour.
